



**HELSEPLATTFORMEN**  
for pasientens helsetjeneste

Status

KS Trøndelag

# Kostnadsestimeringsmodell

---


- Ble presentert i samarbeidsrådets møte 22. april, tas opp på nytt 5. juni
- Flere kommuner har vært involvert i arbeidet
- Skal gi et godt utgangspunkt for å gjøre lokal estimering, men krever selvsagt lokal input
- Videre introduksjon i den enkelte kommune vil koordineres gjennom regional innføringsleder med støtte fra Helseplattformen
- Modellen må oppdateres løpende når ny informasjon tilkommer
  - Viktige avklaringer knyttet til felleskostnader og «first-mover kostnader» gjenstår

# Ny skisse for produksjonssettingsløp og tidspunkt for uttak av opsjon

---

- Det skisseres nå 6 produksjonssettinger i perioden 2021 – 2023:
- Kun St. Olavs Hosp. og Trondheim kommune i Q4 i 2021 – produksjonssetting 1
- Sykehus i N-Trøndelag + de kommunene i *hele* Trøndelag som har tatt ut opsjon innen fristen (12 mnd. før), Q2 i 2022 – produksjonssetting 2
- Sykehus i M&R + kommuner, Q4 i 2022 - produksjonssetting 3
- I 2023 opprettes det tre «bølger» der kommunene får en ny mulighet til å koble seg på HP – produksjonssetting 4, 5 og 6.
- Dette betyr at alle kommunene i Midt-Norge blir tilbudt HP innen utgangen av 2023.

# Det skisseres seks produksjonssettinger i perioden 2021-2023

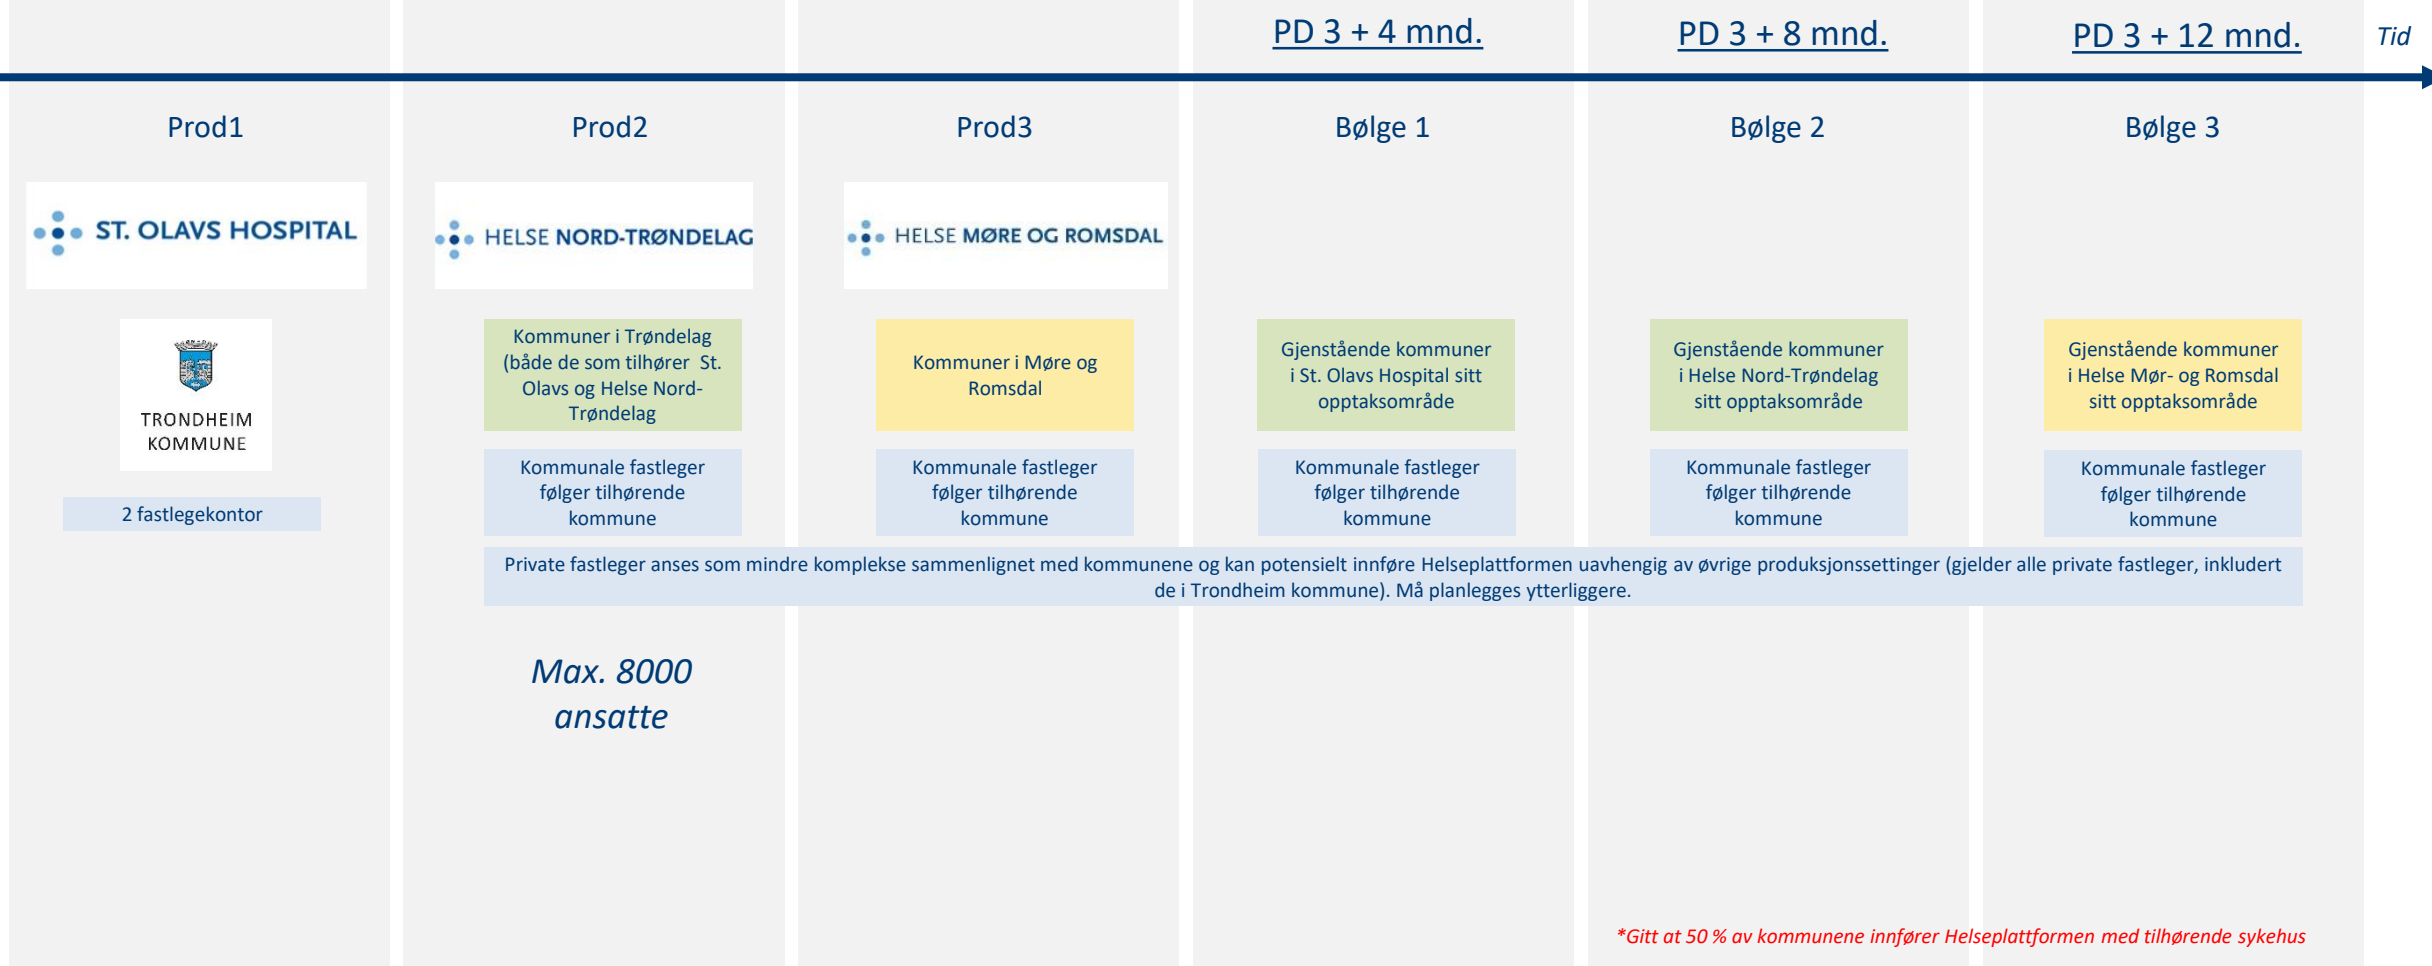


Prod. = Produksjonsfase

\*De kommunale fastlegene i Trondheim følger samme prinsipp som private fastleger

Merk: Eventuelle forsinkelser i HMP vil parallellforskyve SW1-3

## Kommunene må starte sitt innføringsprosjekt 19 mnd. forut for produksjonssetting

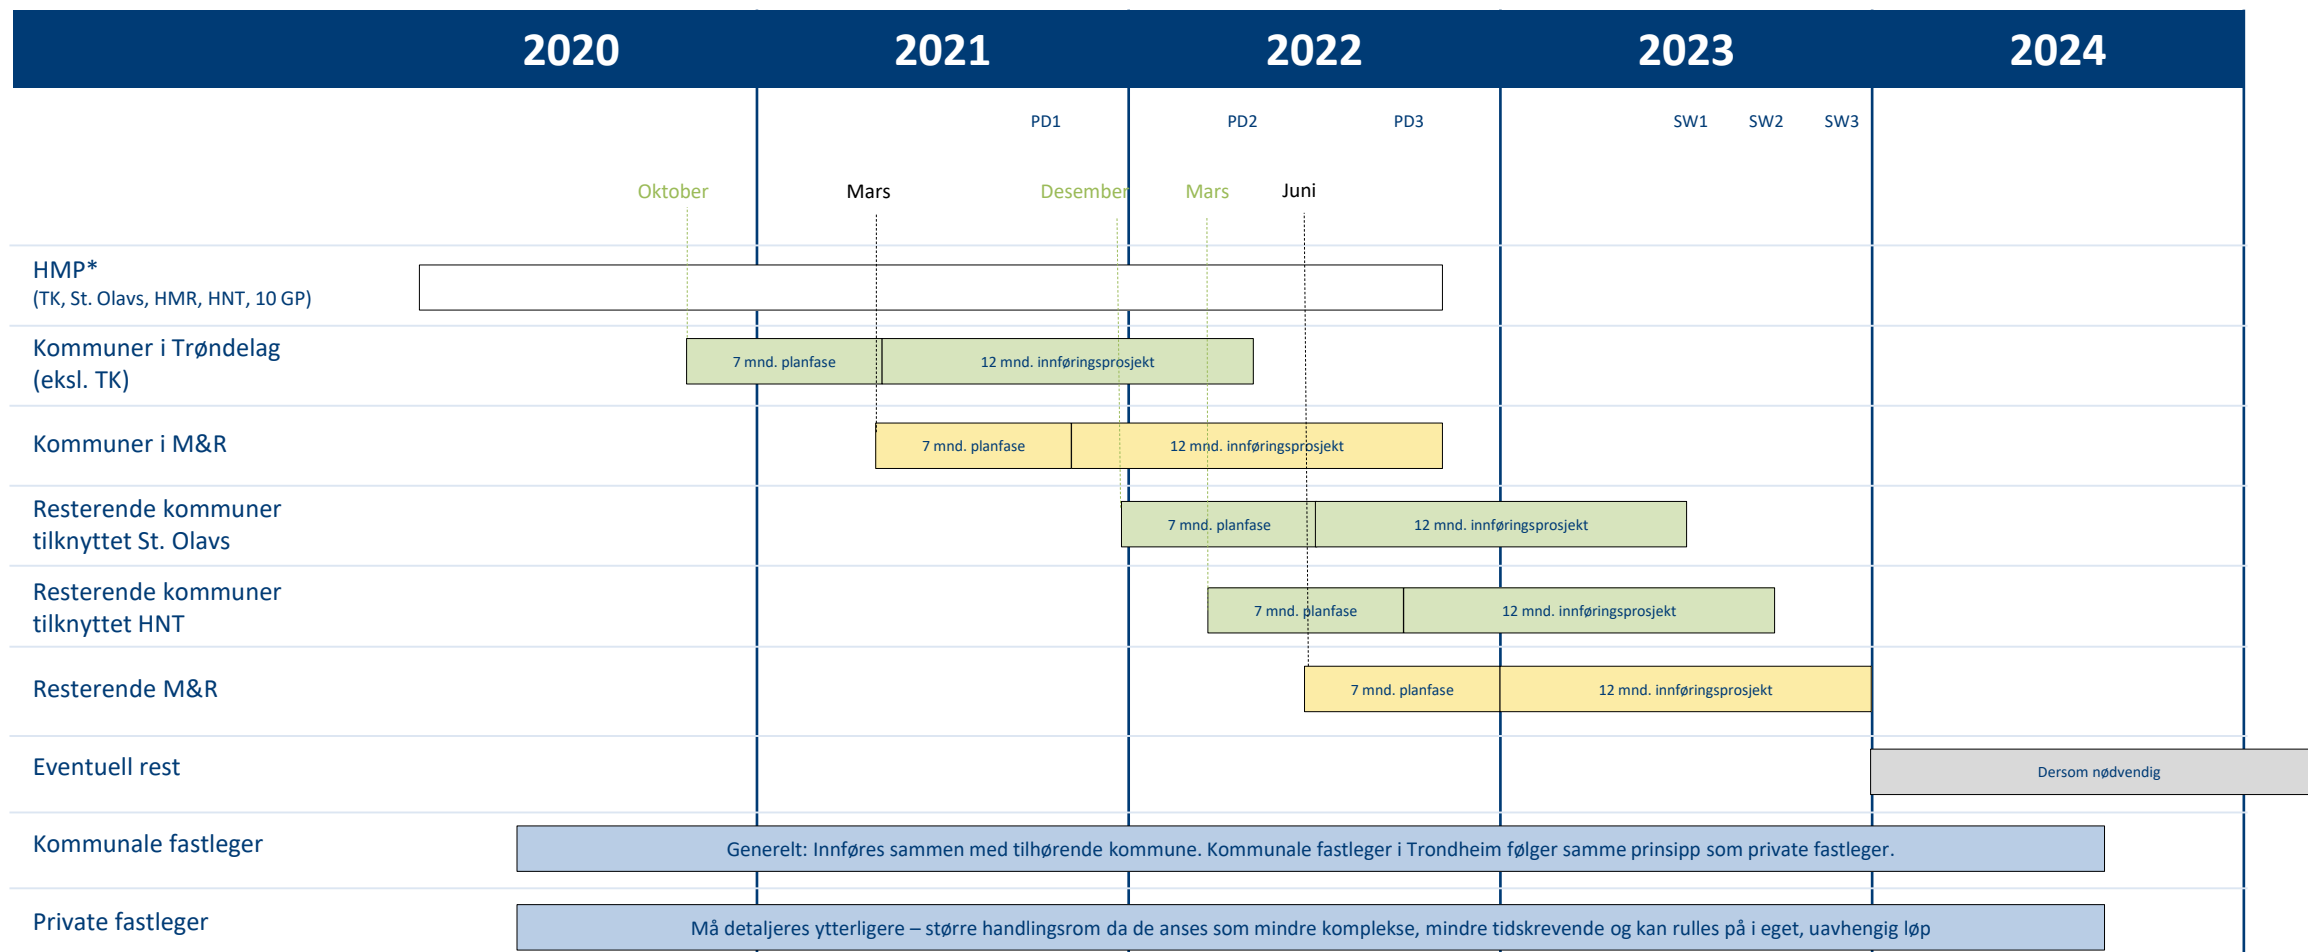

HMP = Helseplattformens hovedprosjekt (main project)

PD = Partial Delivery


SW = Second wave

Ingen kommuner, sett bort fra Trondheim, vil kunne ta systemet i bruk i PD1

Merk: Eventuelle forsinkelser i HMP vil parallellforskyve SW1-3

# Eksempel – Malvik (men gjelder alle kommuner i Trøndelag)

- PD 2 og SW 1 er aktuelle go-live tidspunkt for Malvik
- Må inngå avtale om forprosjekt innen 31. oktober 2020
  - Vil bli innført sammen med Helse Nord-Trøndelag i mai 2022
- Må inngå avtale om forprosjekt innen 31. desember 2021
  - Vil bli innført sammen med andre kommuner tilknyttet St. Olavs (som ikke alt er innført sammen med Helse Nord-Trøndelag) i Q2 2023
- Starte opp prosjekt på et tidspunkt etter 2023
  - Helseplattformen AS vil i sin forvaltningsorganisasjon legge til rette for at det er mulig

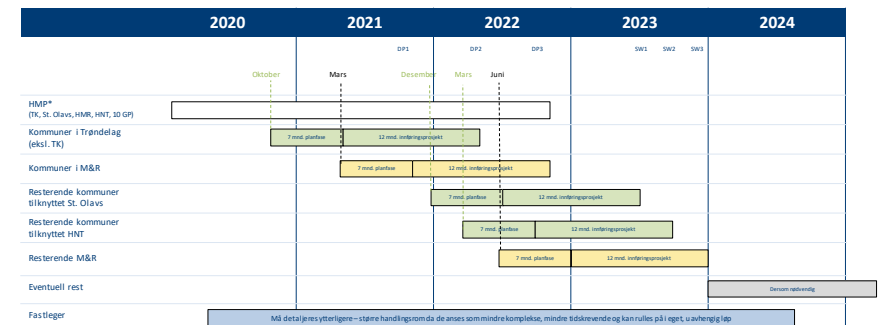

HMP = Helseplattformens hovedprosjekt (main project)  
PD = Partial Delivery  
SW = Second wave

Ingen kommuner, sett bort fra Trondheim, vil kunne ta systemet i bruk i PD1

Mer: Eventuelle forsinkelser i HMP vil parallellforskyve SW1-3

# Regional ArbeidsGruppe (RAG)

- Ledes av Trondheim kommune ved Tor Erling Evjen
- Består av 11 representanter fra alle eksisterende kommuneregioner i Trøndelag og Møre og Romsdal
- Regionale innføringsledere har ansvar for å koordinere arbeidet lokalt og rapporterer inn til Samarbeidsrådet



# Oversikt over kommuneregionene i Trøndelag

Region	Ant.	Kommuner	RIL
Trondheimsområdet og Fjellregionen	5	<b>Malvik</b> , Melhus, Midtre Gauldal, Holtålen, Røros	Grethe Sjøli
Fosen	3	<b>Indre Fosen</b> , Ørland, Åfjord	Tove Penna Steen
Orkdalsregionen	9	<b>Orkland</b> , Rennebu, Heim, Skaun, Frøya, Hitra, Surnadal, Rindal, Oppdal	Line W. Raustein
Værnesregionen	5	<b>Stjørdal</b> , Frosta, Meråker, Selbu, Tydal	Eva Kvål
Innherred	2	<b>Levanger</b> , Verdal	Kristin H. Nøst
Inn-Trøndelag	3	<b>Steinkjer</b> , Inderøy, Snåsa	Anne Solberg
Namdalsregionen	12	Nærøysund, Leka, Bindal, Namsos, Overhalla, Osen, Namsskogan, Flatanger, Lierne, Røyrvik, Grong, Høylandet	Arne Bangstad





**HELSEPLATTFORMEN**  
for pasientens helsetjeneste

Oppdatert og fortløpende informasjon finner du her:

Følg med på [nettside](#)
